

横道赤砂第1砂防堰堤整備工事【回覧】



いよいよ夏の到来を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。
我々作業員一同は、日々の暑さにも負けず頑張っています。

今月も『横道赤砂第一砂防堰堤工事』に於いて、現場での進捗状況・お知らせ、
様々な取り組みについてご紹介したいと思います。

工事中は何かとご不便お掛けすることと思いますが引き続き変わらぬご理解、ご
協力賜りますようお願い申し上げます

なお、何か工事についてお気付きの点がございましたら下記までご連絡下さい
ますようお願い致します。 **+** 現場代理人・監理技術者・羽賀達男

～～ 現在の現場作業状況について ～～

【 鋼製第1水叩き（右岸） 】



床掘掘削




均しコンクリート打設状況



均しコンクリート打設完了



鋼製枠組立状況

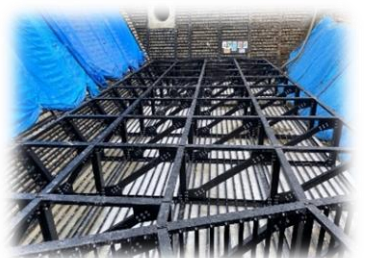

鋼製枠組立完了



詰め石作業状況



詰め石作業完了



全景写真



* 熱中症対策 *

① クーラーボックス ジャグ(ポカリスエット) 保冷剤

毎朝ジャグにポカリスエットを作り
休憩時に冷たい飲み物が飲めるよう
にしています。



② 熱中症キット常備

熱中症にならないよう気を付けていますが
なにかあった時の為に熱中症キットを常備
しています。(OS1や瞬間冷却保冷剤等)



③ 熱中症計の使用

熱中症計を常備し計測を行って
います。WBGT値が28℃以上になった
場合はすぐに作業を中止し細めに水分
塩分をとるようにしています。



④ 現場に日よけテント設置

現場に日よけテントを設置し、
休憩時はテントの中で休憩しています。



* ワイヤロープ点検 *



安全



第一

当現場では、鋼材吊り上げ作業
時に使用するワイヤロープ
の点検を行っています。
月ごとに点検し色のついたテー
プをはり目視で判断できるよう
にしています。

1.5.9月 ⇒ みどり
2.6.10月 ⇒ きいろ
3.7.11月 ⇒ あか
4.8.12月 ⇒ しろ

発行・編集 永井建設(株) 横道赤砂工事現場事務所

会社ホームページ <http://www.nagai-construction.com/>

担当：羽賀達男
