第　６　号

令和元年10月吉日

一般国道13号
泉田道路
IZUMITA ROAD

# 西山中地区道路工事だより

いよいよ秋も深まり夜寒を覚えるこの頃、皆様もお変わりなくお過ごしでしょうか。

さて、西山中地区の工事に於いては、盛土作業が完了し構造物工事（道路函渠、排水構造物等）を施工中です。工事は１２月２０日まで工期が延長になりましたので、併せてご報告致します。

工事中は何かとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、細心の注意を払いながら工事を進めて参りますので、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 ✚永井建設 津藤、佐藤

## ☆ 現在の施工状況と今後の施工について

現在の施工は、現場で一番奥の第１５号道路函渠を施工する上で工事用道路（現場入口から約600m）を、完成した盛土上に造成しています。道路函渠は工場にて既に製作済みで、11月5日から現場に運び施工予定です。函渠自体が大きいため４分割に分けて製作し、現場にて組立てを行います。分割しても１番重い物で14ｔもの重量があるため、大型のクレーンを現場に搬入し施工します。その為、１１月５日から大型車の往来がありますので、近隣の方はご協力お願い致します。次号にて、道路函渠の組立てをご紹介致します。

●水路施工

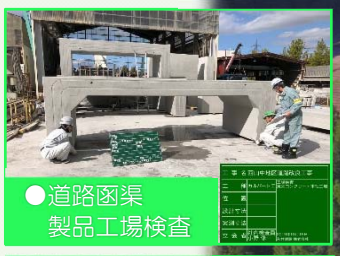
●道路函渠
製品工場検査

●道路函渠
床掘状況




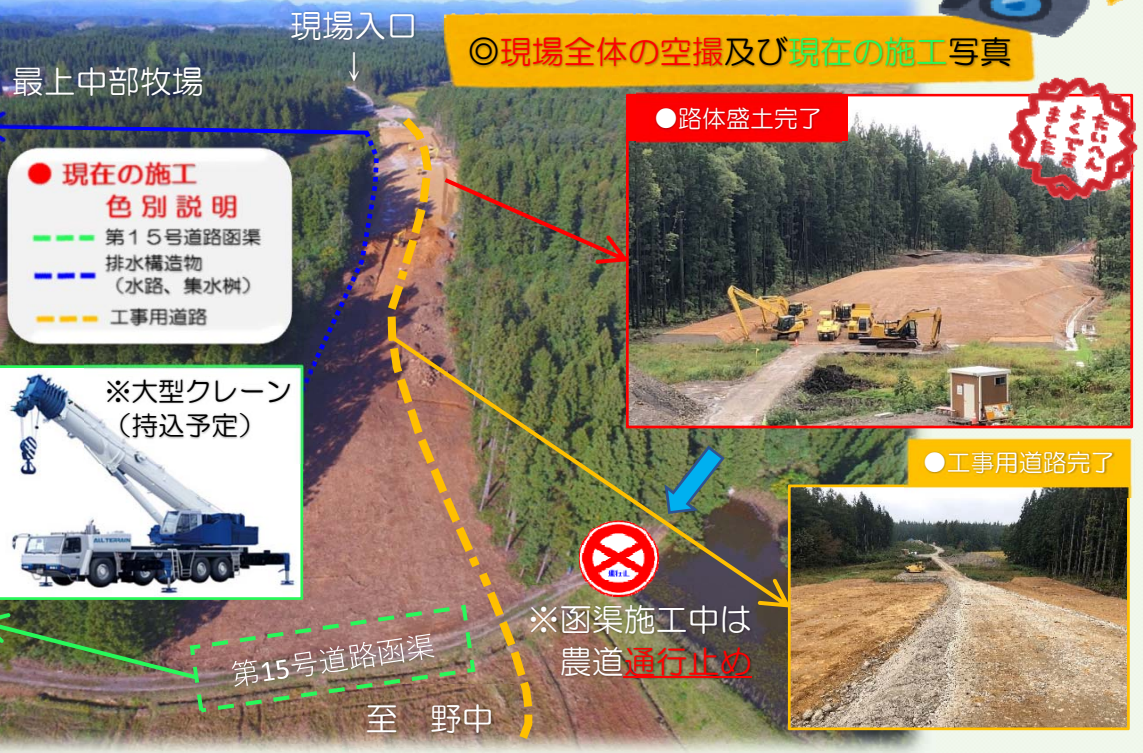


## ☆現場での安全・社会貢献への取組み

◎9月27日　本社より女性社員を招き、現場パトロールを実施しました。女性の目線から現場を見てもらうことで、普段気がつかない様なことなど質問があり、とても勉強になりました。

休憩所は快適そうですね!!

快適トイレがキレイ!!

◎10月17日　駅前町内会より依頼を受けゴミステーションの補修を行いました。駅前３ヵ所の屋根の張替えと敷板の設置を行いました。何かご要望があれば出来る範囲で対応しますので、下記連絡先までお気軽にご相談下さい。

発行・編集　永井建設㈱　西山中道路現場事務所 TEL 0233-29-5523　担当：津藤、佐藤

さらに詳しい内容を知りたい方は会社ホームページまで

会社ホームページ　http://www.nagai-construction.com/

永井建設ウェブ
